


## 施主代行業務 標準仕様書

平成27年9月30日付農林水産省通知「強い農業づくり交付金交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて」に基づき、下表の業務を行うものとする。（契約の流れは別図のとおり）

	製造請負工事
1. 基本設計、仕様の作成	<ul style="list-style-type: none"><li>① 必要処理能力・仕様の算定</li><li>② 類似施設の情報収集</li><li>③ レイアウトの検討</li><li>④ 施設機械の見積収集と内容検証</li><li>⑤ 仕様書の作成</li><li>⑥ 概算工事費の検討</li></ul>
2. 実施設計の作成 または検討	<ul style="list-style-type: none"><li>① 業者作成の実実施設計の検討<ul style="list-style-type: none"><li>・ 処理能力の検討</li><li>・ 価格内訳の検討</li><li>・ 工期、工程の検討</li><li>・ 実施設計の確認、承認</li></ul></li></ul>
3. 工事の施行	<ul style="list-style-type: none"><li>① 業者選定方法の検討</li><li>② 入札要項書の作成、現場説明会、目標価額設定</li><li>③ 入札の執行</li><li>④ 工事請負契約の締結</li><li>⑤ 工事補償保険等の付保（別途協議）</li><li>⑥ 工事代金の決済・精算</li></ul>
4. 施工管理 (工事の監理を含む)	<ul style="list-style-type: none"><li>① 着工</li><li>② 定期工程会議の開催</li><li>③ 進捗管理、工程検査</li><li>④ 施工図検討・承認</li><li>⑤ 出来高設計の検討</li><li>⑥ 試運転検査</li><li>⑦ 竣工検査、手直し指示</li><li>⑧ 施設引渡し</li></ul>

【契約の流れ】

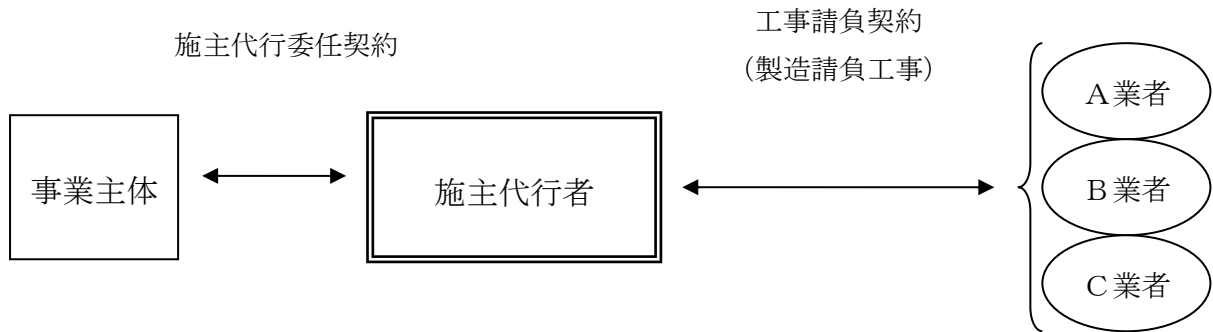

以上
